

# Réalisations d'arrosage automatique

## Jardin Charcot


### Rue du Chevaleret – Rue Alphonse Boudard Paris XIIIème

**MAIRIE DE PARIS**



#### Description

- \* Année 2018
- \* Durée des travaux : 2 Mois
- \* Période des travaux :  
 . Début Février – Avril
- \* Coût de l'opération : 6497,47 €
- \* Maître d'ouvrage : Mairie de Paris

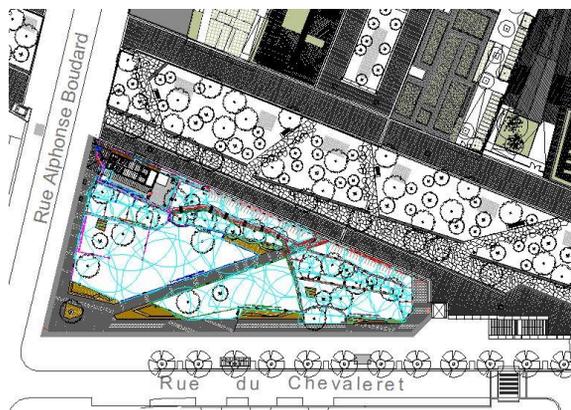

#### Arrosage automatique

- Goutte-à-Goutte 1,6L/H.....	20 ml
- Filtre Régulateur de pression 1".....	1 u
- Tuyère 1804.....	66 u
- Tuyère 1812.....	14 u
- Arroseur 5004.....	22 u
- Clapet-Vanne 1".....	5 u
- Prise d'eau manuelle.....	1 u
- Borne Fontaine.....	1 u
- Electrovanne 1".....	8 u
- Vanne à Boisseau Sphérique 1".....	8 u
- Regard Jumbo.....	1 u
- Programmateur autonome WP8.....	1 u
- Vanne-Maitresse 1".....	1 u
- Compteur DN20.....	1 u
- Disconnecteur DN25.....	1 u
- Compteur DN25.....	2 u
- Tuyau PEHD Ø16.....	10 ml
- Tuyau PEHD Ø25.....	150 ml
- Tuyau PEHD Ø32.....	725 ml
- Tuyau PEHD Ø25 bande bleue.....	25 ml
- Câble électrique 5Gx1,5mm2.....	50 ml
- Fourreau TPC Ø90.....	50 ml

#### Chantier

